


ID	Modali attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecess	Tri 3, 2023 lug ago set	Tri 4, 2023 ott nov dic	Tri 1, 2024 gen feb mar	Tri 2, 2024 apr mag giu	Tri 3 lug
0		<b>PFTE</b>	<b>258 giorni</b>	<b>mer 26/07/23</b>	<b>dom 21/07/24</b>						
1		1 OdS Avvio PFTE	0 giorni	mer 26/07/23	mer 26/07/23						
2		2 Piano delle indagini	10 giornit	mer 26/07/23	sab 05/08/23	1					
3		3 Nulla osta ENAS per indagini	10 giornit	sab 05/08/23	mar 15/08/23	2					
4		4 Esecuzione indagini	30 giornit	mar 15/08/23	gio 14/09/23	3					
5		5 Studio preliminare ambientale	30 giornit	gio 14/09/23	sab 14/10/23	4					
6		6 Procedura assoggettabilità a VIA	90 giornit	sab 14/10/23	ven 12/01/24	5					
7		7 Sviluppo PFTE	60 giornit	gio 14/09/23	lun 13/11/23	1;4					
8		8 Verifica PFTE	15 giornit	lun 13/11/23	mar 28/11/23	7					
9		9 Procedura autorizzazione unica	90 giornit	mar 28/11/23	lun 26/02/24	8;6FF					
10		10 Approvazione PFTE SOI	30 giornit	lun 26/02/24	mer 27/03/24	9					
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											

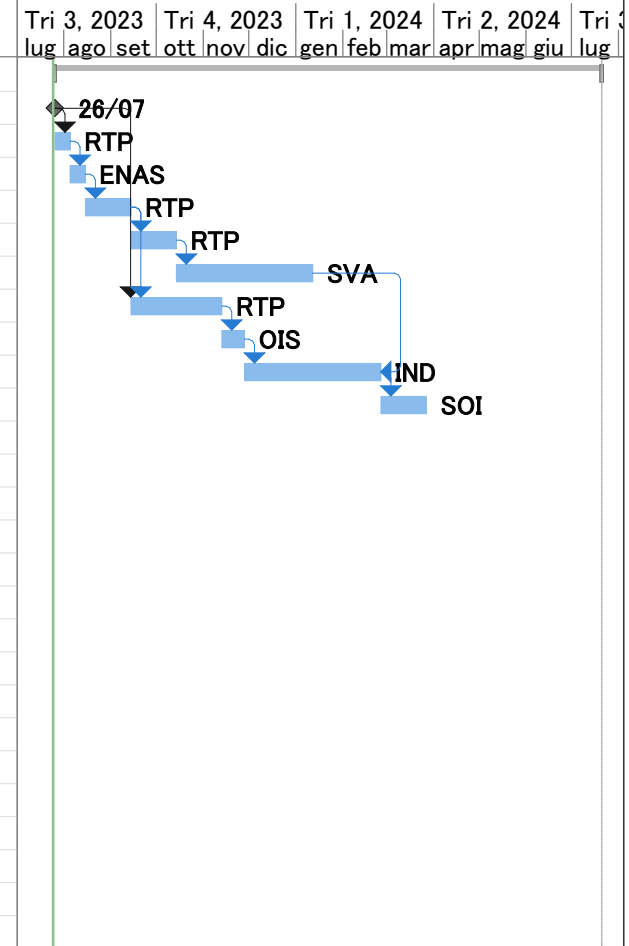

Progetto: PFTE Data: mar 25/07/23	Attività		Attività inattiva		Solo inizio	
	Divisione		Cardine inattiva		Solo-fine	
	Cardine		Riepilogo inattiva		Scadenza	
	Riepilogo		Attività manuale		Critica	
	Riepilogo progetto		Solo-durata		Divisione critica	
	Attività esterne		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
	Cardine esterno		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	

05\_GANTT - LOTTO 3

ID	Modali attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecess													
							Tri 3, 2023	Tri 4, 2023	Tri 1, 2024	Tri 2, 2024	Tri 3, 2024								
							lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36			22,13 giorni	dom 23/06/24	dom 21/07/24														

Progetto: PFTE  
Data: mar 25/07/23

Attività		Attività inattiva		Solo inizio	
Divisione		Cardine inattiva		Solo-fine	
Cardine		Riepilogo inattiva		Scadenza	
Riepilogo		Attività manuale		Critica	
Riepilogo progetto		Solo-durata		Divisione critica	
Attività esterne		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Cardine esterno		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	

05\_GANTT - LOTTO 3
